


建设项目进度控制

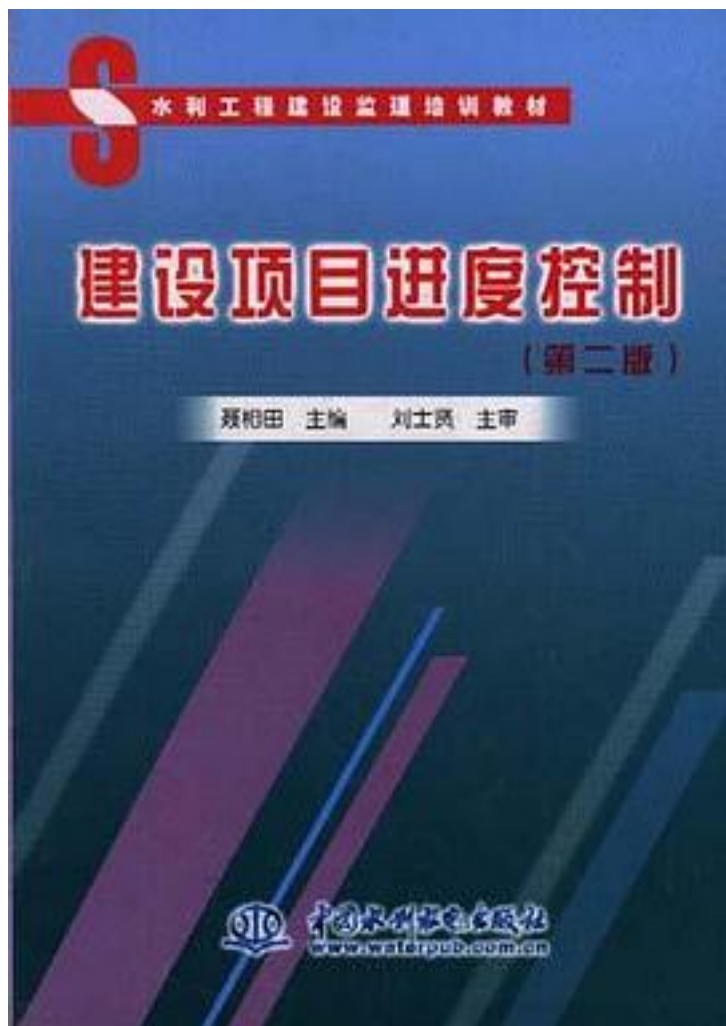

[建设项目进度控制 下载链接1](#)

著者:王端良 编

出版者:水利电力出版社

出版时间:2001-11

装帧:平装

isbn:9787801249302

内 容 提 要

该书共七章，主要从施工进度控制概论、CPM网络计划、网络计划的优化、非肯定型网络计划、设计阶段进度控制、施工阶段进度控制及工期索赔等方面，系统地介绍了监理工程师进行进度控制的方法、影响因素以及工期索赔的处理。

该书既可作为高等院校监理专业的教材，也可作为监理培训教材，还可供从事监理工作的人员学习和参考。

作者介绍:

目录: 目录

前言

第一章 施工进度控制概论

第一节 施工进度控制的概念

第二节 施工进度控制的基础工作

第三节 施工进度计划的编制

第二章 CPM网络计划

第一节 概述

第二节 绘图规则

第三节 双代号网络图的绘制

第四节 时间参数计算

第五节 有时限的网络计划

第六节 搭接网络计划

第三章 网络计划的优化

第一节 网络计划优化的概念

第二节 网络计划的工期优化

第三节 网络计划的资源优化

第四节 网络计划的费用优化

第四章 非肯定型网络计划

第一节 计划评审技术PERT

第二节 图示评审技术GERT

第五章 设计阶段的进度控制

第一节 设计阶段进度控制的意义

第二节 设计阶段进度控制的内容

第三节 监理工程师在设计进度控制中的职责

第六章 施工阶段的进度控制

第一节 施工进度计划的审查

第二节 实际进度与计划进度的比较分析

第三节 施工进度计划的调整

第七章 工期索赔

第一节 工期索赔的依据

第二节 工期索赔的程序

第三节 监理工程师对工期索赔的处理

参考文献

• • • • • (收起)

标签

评论

[建设项目进度控制_下载链接1](#)

书评

[建设项目进度控制_下载链接1](#)
