


建设工程进度控制

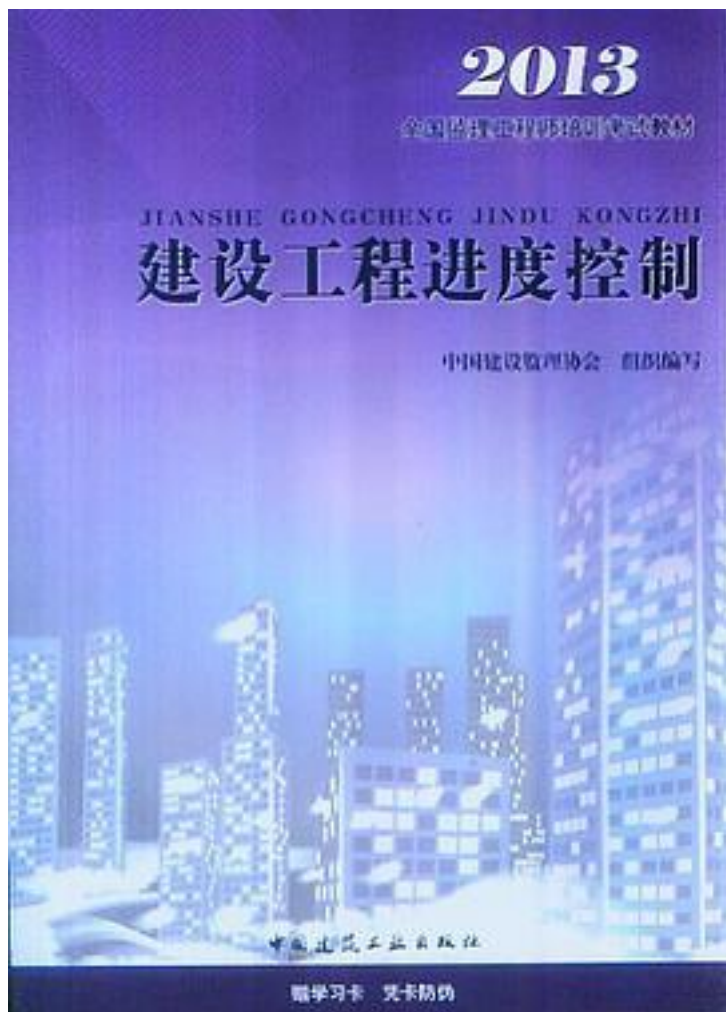

[建设工程进度控制 下载链接1](#)

著者:中国建设监理协会 编

出版者:中国建筑

出版时间:2003-1

装帧:

isbn:9787112055357

《全国监理工程师培训考试教材:建设工程进度控制(2013)》为全国监理工程师培训考试

教材，由中国建设监理协会组织编写。在修订过程中注重了现行的政策法规、突出了教材的实用性、注重了业务的前瞻性、增强了体系结构的完整性。此外，凡购买《全国监理工程师培训考试教材:建设工程进度控制(2013)》的读者，可获赠一张由建设工程教育网提供的优惠20元的学习卡，读者可凭此卡可得到网上免费答疑服务。

作者介绍:

目录:第一章 建设工程进度控制概述 第一节 建设工程进度控制的概念
一、进度控制的概念 二、影响进度的因素分析 三、进度控制的措施和主要任务 第二节
建设工程进度控制计划体系 一、建设单位的计划系统 二、监理单位的计划系统
三、设计单位的计划系统 四、施工单位的计划系统 第三节
建设工程进度计划的表示方法和编程序 一、建设工程进度计划的表示方法
二、建设工程进度计划的编程序 思考题第二章 流水施工原理 第一节 基本概念
一、流水施工 二、流水施工参数 三、流水施工的基本组织方式 第二节 有节奏流水施工
一、固定节拍流水施工 二、成倍节拍流水施工 第三节 非节奏流水施工
一、非节奏流水施工的特点 二、流水步距的确定 三、流水施工工期的确定 思考题
练习题第三章 网络计划技术 第一节 基本概念 一、网络图和工作
二、工艺关系和组织关系 三、紧前工作、紧后工作和平行工作
四、先行工作和后续工作 五、线路、关键线路和关键工作 第二节 网络图的绘制
一、双代号网络图的绘制 二、单代号网络图的绘制 第三节 网络计划时间参数的计算
一、网络计划时间参数的概念 二、双代号网络计划时间参数的计算
三、单代号网络计划时间参数的计算 第四节 双代号时标网络计划
一、时标网络计划的编制方法 二、时标网络计划中时间参数的判定
三、时标网络计划的坐标体系 四、形象进度计划表 第五节 网络计划的优化
一、工期优化 二、费用优化 三、资源优化 第六节 单代号搭接网络计划
一、搭接关系的种类及表达方式 二、搭接网络计划时间参数的计算 第七节
多级网络计划系统 一、多级网络计划系统及其特点
二、多级网络计划系统的编制原则和方法 思考题 练习题第四章
建设工程进度计划实施中的监测与调整方法 第一节 实际进度监测与调整的系统过程
一、进度监测的系统过程 二、进度调整的系统过程 第二节
实际进度与计划进度的比较方法 一、横道图比较法 二、S曲线比较法
三、香蕉曲线比较法 四、前锋线比较法 五、列表比较法 第三节
进度计划实施中的调整方法 一、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
二、进度计划的调整方法 思考题第五章 建设工程设计阶段的进度控制 第一节 概述
一、设计阶段进度控制的意义 二、设计阶段进度控制工作程序 第二节
设计阶段进度控制目标体系 一、设计进度控制分阶段目标
二、设计进度控制分专业目标 第三节 设计进度控制措施 一、影响设计进度的因素
二、设计单位的进度控制 三、监理单位的进度监控 四、建筑工程管理方法
思考题第六章 建设工程施工阶段的进度控制 第一节 施工阶段进度控制目标的确定
一、施工进度控制目标体系 二、施工进度控制目标的确定 第二节
施工阶段进度控制的内容 一、建设工程施工进度控制工作流程
二、建设工程施工进度控制工作内容 第三节 施工进度计划的编制
一、施工总进度计划的编制 二、单位工程施工进度计划的编制 第四节
施工进度计划实施中的检查与调整 一、影响建设工程施工进度的因素
二、施工进度动态检查 三、施工进度计划的调整 第五节 工程延期
一、工程延期的申报与审批 二、工程延期的控制 三、工程延误的处理 第六节
物资供应进度控制 一、物资供应进度控制概述 二、物资供应进度控制的工作内容
思考题主要参考文献

• • • • • (收起)

[建设工程进度控制_下载链接1](#)

标签

工程管理

评论

19拿证

[建设工程进度控制 下载链接1](#)

书评

[建设工程进度控制 下载链接1](#)
